

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОР и ТО ОАО "СНХЗ"  
А.В. Мигунов

" 30 " 09 2021 г.

*срочно!!!*

СВОДНАЯ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ *266*

На ремонт женской раздевалки в спорт-зале зд.К-27 заказ № \_\_\_\_\_ цех \_\_\_\_\_

Срок с начала ремонта план \_\_\_\_\_ фактич. \_\_\_\_\_  
Срок окончания ремонта план \_\_\_\_\_ фактич. *1-33-21*


№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Исполнитель	Срок ремонт		Потребные зап. части	Примечание
					начало	окончание		
1	2 <i>Холл</i>	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж деревянных плинтусов	п.м.	10,5	✓				
2	Демонтаж эл.кабеля	п.м.	5	✓				
3	Демонтаж декоративного покрытия со стен 100%	м2	18,9	✓				
4	Ремонт штукатурки толщ. 10мм	м2	9	✓			Смеси сухие штукатурные	
5	Огрунтовка поверхности антибактериальной противогрибковой грунтовкой	м2	18,9	✓			Грунтовка	
6	Нанесение декоративной влагостойкой штукатурки	м2	18,9	✓			Штукатурка влагостойкая декоративная	
7	Покраска стен влагостойкой матовой краской	м2	18,9	✓			Краска влагостойкая	
8	Устройство полов из модульных ПВХ покрытий для спортзалов (пазлы), толщиной не менее 10мм	м2	10	✓			Плитки из ПВХ материалов	
9	Шлифовка деревянных дверей от лака	м2	11	✓				
10	Покрытие деревянных дверей краской для дерева	м2	11	✓			Краска для дерева	
11	Замена петель дверных	шт.	6	✓			Петля дверная, усиленная	
12	Монтаж плинтусов пластиковых с кабель каналом	п.м.	8	✓			Плинтус пластиковый - 4шт., Уголок внутренний 4шт., Заглушки торцевые 6 шт.	
13	Демонтаж деревянных плинтусов	п.м.	12,4	✓				


14	Демонтаж декоративного покрытия со стен 100%	м2	30	✓					
15	Ремонт штукатурки толщ. 10мм	м2	15	✓					
16	Огрунтовка стен поверхности антибактериальной противогрибковой грунтовкой	м2	30	✓					
17	Нанесение декоративной влагостойкой штукатурки	м2	30	✓					
18	Покраска стен влагостойкой матовой краской	м2	30	✓					
19	Устройство полов из модульных ПВХ покрытие для	м2	7	✓					
20	Монтаж плинтусов пластиковых с кабель каналом	п.м.	10	✓	✓			Плинтус пластиковый 5 шт. Уголок внутренний 5 шт. Уголок наружный 2шт. Заглушки торцевые 8шт.	
21	Разборка потолка из листового металла	м2	8	✓					
22	Чистка металлического потолка от старой краски и ржавчины	м2	8	✓					
23	Обработка м/к потолка ортофосфорной кислотой	м2	6	✓	✓			Кислота ортофосфорная	
24	Огрунтовка потолка грунтовкой по металлу	м2	8	✓	✓			Грунтовка по металлу	
25	Покраска потолка краской резиновой	м2	8	✓	✓			Краска резиновая	
26	Очистка труб от старой краски	м2	2,5	✓					
27	Обработка м/к потолка ортофосфорной кислотой	м2	1,5	✓	✓			Кислота ортофосфорная	
28	Огрунтовка труб грунтовкой по металлу	м2	2,5	✓	✓			Грунтовка по металлу	
29	Покраска труб краской резиновой	м2	2,5	✓	✓			Краска резиновая	
	<i>Душевая</i>								
30	Демонтаж дверей деревянных 2 шт.	м2	3,1	✓					
31	Демонтаж душевых перегородок кирпичных 3шт.	м3	1,14	✓					
32	Разборка облицовки стен из плиток керамических	м2	86	✓					
33	Демонтаж старого клея плиточного	м2	86	✓					
34	Демонтаж полипропиленовых труб водоснабжения Ду20	п.м.	40	✓					
35	Штробление стен под скрытую проводку системы водоснабжения	п.м.	40	✓					
36	Монтаж полипропиленовых труб системы водоснабжения Ду20	п.м.	40	✓	✓			Труба Ду20-20шт.,	
					✓			Угольник соединительный 90 - бшт.,	

										Планка полипропиленовая для подключения смесителя d20x1/2" внутренняя резьба 4шт.	✓	
										Тройник полипропиленовый соединительный под пайку PN25 d20мм - 6шт.	✓	
										Скоба полипропиленовая обводная с муфтой d20мм - 3шт.	✓	
37	Огрунтовка стен поверхности антибактериальной противогрибковой грунтовкой	м2	86	✓								
38	Штукатурка стен толщиной 10мм	м2	86	✓						Смеси сухие штукатурные влагостойкие	✓	
39	Оклейка стен плиткой керамогранит размером 1200x600	м2	69	✓						Плитка керамогранит 1200x600	✓	
40	Затирка швов плитки	м2		✓						Клей плиточный	✓	
41	Покрытие стен гидроизоляцией проникающей	м2	17	✓						Смесь затирочная	✓	
42	Демонтаж деревянного окна 1195x0,595	м2	0,72	✓						Проникающая гидроизоляция	✓	
43	Монтаж пластикового окна	м2	0,72	✓						Окно пластиковое 1195x0,595	✓	
44	Демонтаж деревянной двери 2000x800 - 2шт.	м2	3,2	✓								
45	Монтаж пластиковой двери 2000x800 - 2 шт.	м2	3,2	✓						Дверь пластиковая 2000x800 - 2	✓	
										Замок защелка 1 шт.	✓	
										Ручки дверные 2 шт.	✓	
										Замок ключевой с ручками - 1 шт.	✓	
46	Монтаж систем душевых с верхней лейкой и смесителем	шт.	4	✓						Система душевой с верхней лейкой и смесителем - 4 шт.	✓	
47	Монтаж перегородок для разделения зон душевых из закаленного матового стекла с применением нержавеющей крепежа 12x2,0	шт.	4	✓								
48	Разборка облицовки пола из плиток керамических	м2	22,5	✓								
49	Демонтаж старого клея плиточного	м2	22,5	✓								
50	Огрунтовка поверхности бетона грунтовкой глубокого проникновения	м2	22,5	✓								
51	Монтаж плитки керамогранит 600x600	м2	22,5	✓						Плитка керамогранит 600x600	✓	
										Клей плиточный	✓	
52	Затирка швов пола			✓						Смесь затирочная	✓	


53	Очистка потолка от старой карски 100%	м2	31,5	✓					
54	Огрунтовка потолка антибактериальной противогрибковой грунтовкой	м2	31,5	✓				✓	Грунтовка
55	Заделка швов на потолке между плитами перекрытия пеной строительной	п.м.	20	✓					
56	Заделка швов на потолке между плитами перекрытия шпаклевкой эластичной	п.м.	20	✓				✓	Шпаклевка эластичная
57	Покрытие потолка гидроизоляцией проникающей	м2	31,5	✓				✓	Проникающая гидроизоляция
58	Монтаж подвесного решетчатого потолка Грильято 600x600 с ячейкой 75x75	м2	31,5	✓					
59	Монтаж влагозащитных светильников для подвесных потолков 600x600	шт.	6	✓				✓	Светильники влагозащитные

Начальник цеха: 

Механик цеха 

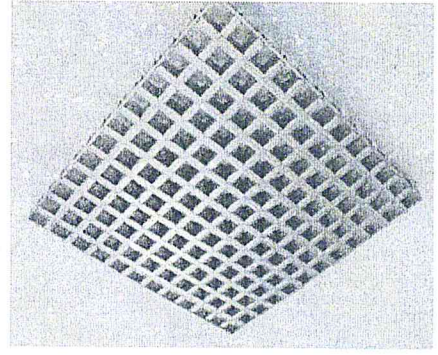

Подвесной Потолок Грильято 75x75 H40 B10 Черный (Алюм. 0,3мм) 1065,00р.

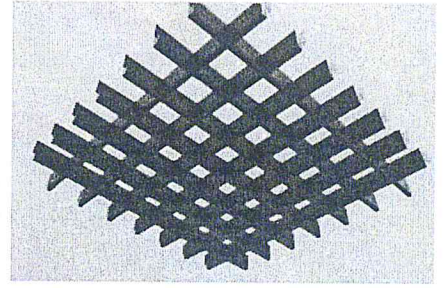

Подвесной Потолок Грильято 75x75 H40 B10 Металлик Серебрист... 972,50р.

